

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1er. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Nombre: Universidad Veracruzana
Entidad federativa: 30 Veracruz
Clave 911: 30MSU09405

Planeación

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Dra. Elisa Calderón Altamirano
Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12719
Correo electrónico: ecalderon@uv.mx

Nombre: Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12702
Correo electrónico: mcano@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Especificos del espacio/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, Fechas Reales, Retorno a la TESDFE, and Actas. It lists 9 projects with their respective budgets, execution dates, and completion status.

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderón Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector

1 Se conforma los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanto fotos como sea necesario.
2 En esta sección se notifica de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA





Trimestre y año que se reporta:
1er. Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

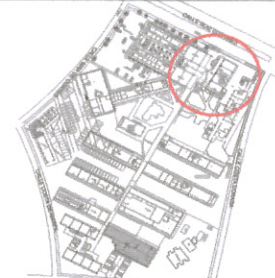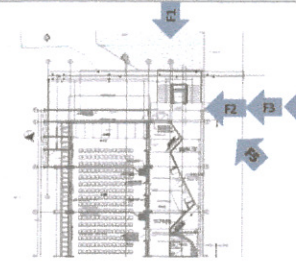LOGO DE LA INSTITUCIÓN  Universidad Veracruzana	PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Suministro y colocación de tarjas y áreas de guardado en el edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USBI, región Veracruz		
Porcentaje de avance 100%	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  BLV. ADOLFO RUIZ CORTINES S/N, FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE. BOCA DEL RIO, VER.

FOTOS



F1: ESCALERAS DEL EDIFICIO "B"



F2: TARJA VISTA DE LADO EN PRIMER NIVEL

Observaciones :

Obra concluida



F3: TARJA VISTA DE LADO EN EL SEGUNDO NIVEL



F4: TARJA VISTA DE LADO EN EL TERCER NIVEL



FOTO 5: ESCALERAS DEL EDIFICIO "B"


 Arq. Miguel Ángel Cano Asseleth
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


 Dra. Elisa Calderón Altamirano
 Encargada de la Dirección de Planeación Institucional


 Dr. Martín Gerardo Aguilera Sánchez
 Rector

NOTA:
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er. Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD


2

Nombre de la obra: **Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz.**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

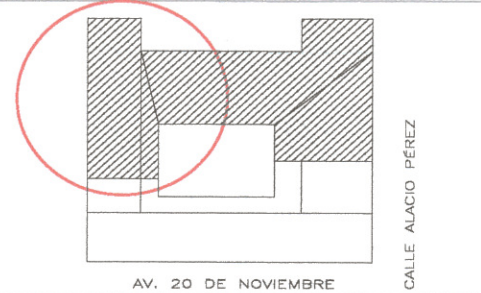

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



FOTOS



F1: Fotografía tomada desde el interior de la biblioteca donde se observa la cubierta y el piso ya terminado, se observa que la facultad ya comenzó a utilizar el área que se intervino.



F2: Fotografía tomada desde el interior de la biblioteca donde se observa la cubierta y el piso ya terminado, se observa que la facultad ya comenzó a utilizar el área que se intervino.

Observaciones :

Obra concluida



F3: Cubierta multipanel ya reparada y colocada vista desde la cubierta misma.



F4: Cubierta multipanel ya reparada y colocada vista desde la cubierta misma.



F5: Cubierta multipanel ya reparada y colocada vista desde la cubierta misma.

Arq. Miguel Angel Cano Asseteh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderin Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martin Gerardo Aguilera Sánchez
Rector

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er. Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Universidad Veracruzana

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: **Acondicionamiento de espacios para investigación en el Edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.**

Porcentaje de avance

100%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

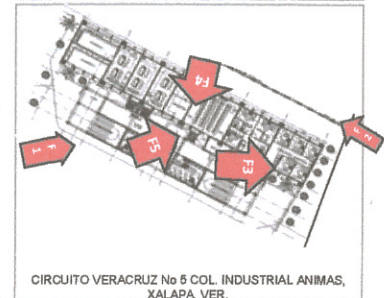

FOTOS



F1: fachada principal



F2: fachada posterior

Observaciones :
Obra concluida




F3: Laboratorios



F4: cuarto de lavado



F5: cubículos


Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Dra. Elise Calderón Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional


Dr. Martín Gerardo Aguilera Sánchez
Rector

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er. Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Universidad Veracruzana

PRIMICIA


4

Nombre de la obra: **Acondicionamiento de espacios en el Taller libre de Artes, región Poza Rica.**


Porcentaje de avance

100%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

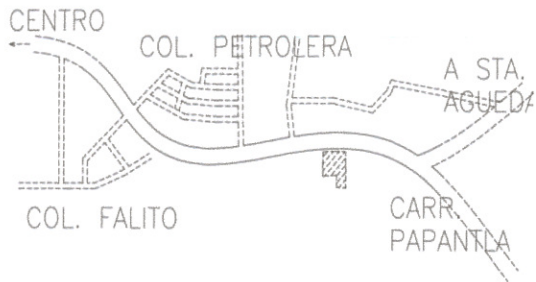

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

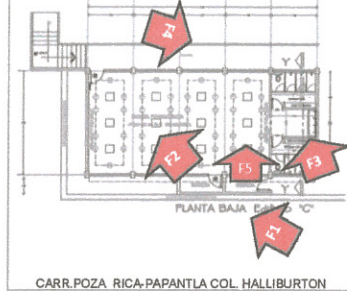

FOTOS



F1: Interior



F2: Fachada



F3: Interior




F4: Interior

Observaciones:
Obra concluida



F5: Baño


Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Dra. Elisa Calderón Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional


Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er. Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN




Universidad Veracruzana

PRIMORDIA **5**

Nombre de la obra: **Adecuación de espacios en los talleres del Instituto de Artes Plásticas, región Xalapa.**

Porcentaje de avance
100%

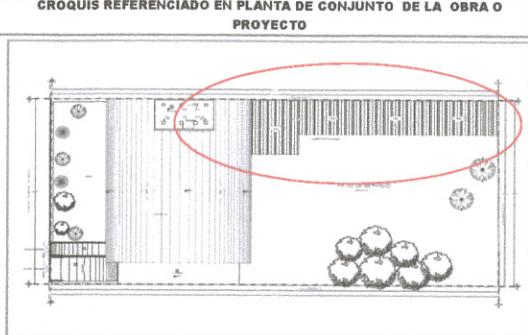

FOTOS



F1: Baños hombres (administración)



F2: Taller de carpintería

Observaciones :
Obra concluida



F3: Taller de carpintería




F4: Baño en zona de talleres



F5: Tapanco


Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Dra. Elisa Calderón Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional


Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre de la obra: **Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal en el edificio B de louver y sistema de captación pluvial con bombeo solar)**

LOGO DE LA INSTITUCIÓN




Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD 6 Nombre de la obra:


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

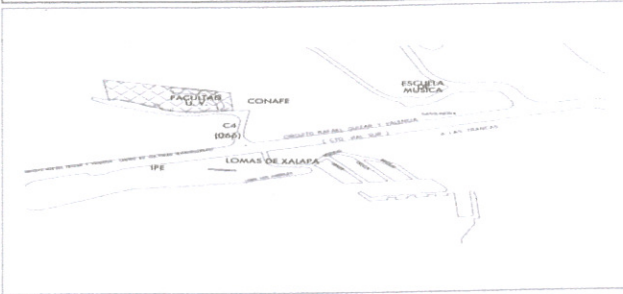

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

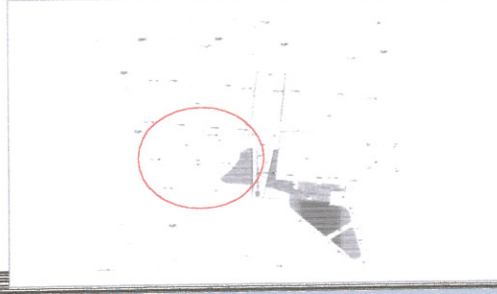

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



CALLE PASEO No. 112, LOTE II SECC. 2A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS




F1: EDIFICIO B VISTA DERECHA



F2: EDIFICIO B VISTA DE FRENTE

Observaciones :

Obra concluida

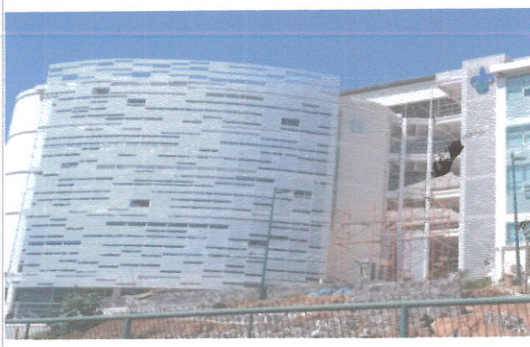

F3: VISTA GENERAL



F4: VISTA DE FACHADA



F5: VISTA DE ÁREA DE CISTERNA PLUVIAL

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderón Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Gerardo Aguilera Sánchez
Rector

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er. Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN




Universidad Veracruzana


PRIORIDAD 7

Nombre de la obra: Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

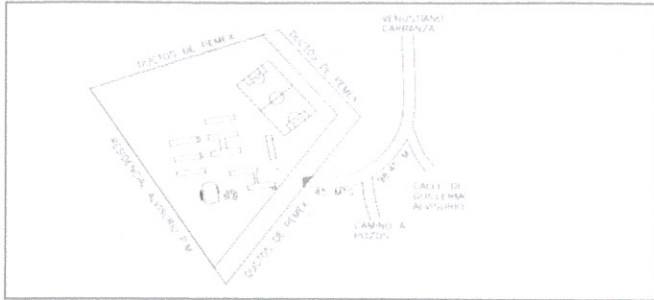

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

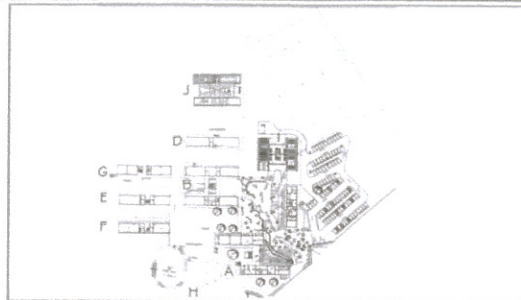

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

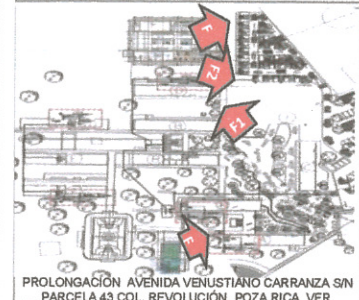

Porcentaje de avance
0%

FOTOS



F1: Edificio D



F2: Edificio I

Observaciones:
Obra por iniciar




F3: Estacionamiento



F4: Edificio A


Arq. Miguel Ángel Cano Asseleth
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Dra. Elise Galderón Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional


Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er. Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Universidad Veracruzana

PRIORIDAD

■


Nombre de la obra:

Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coahuacalcos - Minatitlán


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

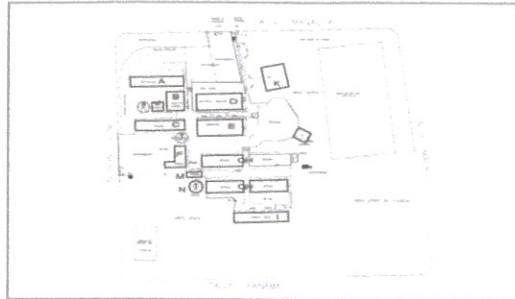

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

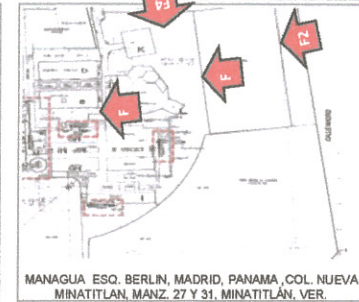

MANAGUA ESQ. BERLIN, MADRID, PANAMA, COL. NUEVA MINATITLÁN, MANZ. 27 Y 31, MINATITLÁN, VER.

Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1



F2

Observaciones :

Obra por iniciar



F3



F4



F5


Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Dra. Elisa Calderón-Hamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional


Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er. Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

70%


PRIORIDAD

9

Nombre de la obra:

Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus sur para las Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

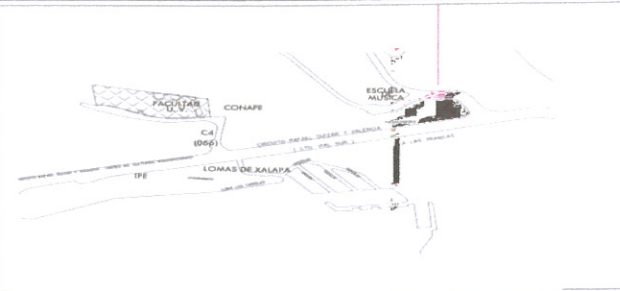

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



CALLE PASEO No. 112, LOTE II SECC. 2A. LETRA B. COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER

FOTOS



F1: ACCESO VEHICULAR



F2: ENTRADA PRINCIPAL



F3: COLINDANCIA CON PEDAGOGÍA



F4: ÁREA DE ANDADORES



F5: ANDADORES

Observaciones :

Obra en proceso

Arg. Miguel Ángel Cano Asselehn
Director de Proyecto, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderón Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
