

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Veracruzana
Entidad federativa: 30 Veracruz
Clave #11: 30MSU09409

Nombre: Dra. Elisa Calderón Almirano
Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12718
Correo electrónico: ecalderon@uv.mx

Nombre: Arq. Miguel Angel Cano Asateleh
Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12702
Correo electrónico: mcano@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				Monto ejercido (D)	Remanente (E) #B-D	Especios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales		Observaciones	OBRA CONCLUIDA							
				No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)			Contratista	Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	Nombre del Espacio/equipamiento			Cantidad	Metros Cuadrados		Reintegro a la TESOFE		Actas					
					INICIO	TÉRMINO												Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega- Recepción (Acta Inicial) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega- Recepción (Formato DUESLU) MONTO	Fecha	
1	Construcción de cubículos para maestro en el Centro de Idiomas y de Asesorías, región Xalapa, complemento de recursos 2.	X	\$ 653.85	11/07/2024	11/12/2024	\$ 0.00		\$ 653.85	\$ 0.00	\$ 0.00	Cubículos 10 78.34 Site 1 11.19 Nucleos 2 15.30 Sanitarios 2 9.22 Circulación 1 117.94 TOTAL 231.89	Obra por iniciar	0%	Inicio	Término	El Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFPLAN) otorgó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2024 Remanente Rendimientos Financieros 1a. inscripción mediante el no. SFPA/637/2024 de fecha 10/June/2024 por \$653.85. Los recursos se encuentran en trámite de gestión en la SEFPLAN para la redacción a la UV.									
			\$653.85			\$0.00		\$653.85	\$0.00	\$0.00															

Arq. Miguel Angel Cano Asateleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderón Almirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Fernando Aguilar Sánchez
Rector

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanto fotos como sus accesos.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todos en dos dígitos: dd, mm y aa.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM



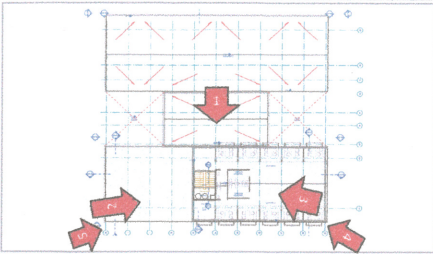

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
2do. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 30/junio/2024

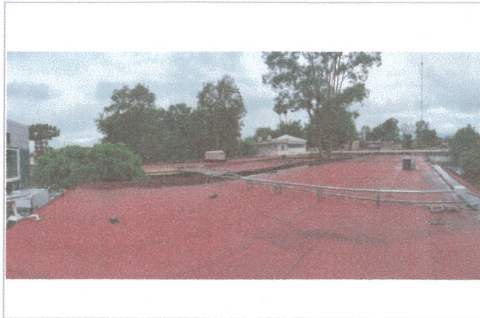
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LUGAR DE LA INSTITUCIÓN  Universidad Veracruzana Porcentaje de avance 0%	PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Construcción de cubículos para maestros en el Centro de Idiomas y de Acceso, región Xalapa, complemento de recursos 2.		
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  PLANTA DE UBICACIÓN GALEANA Y 7 DE NOVIEMBRE, COL. VENUSTIANO CARRANZA, XALAPA, VERACRUZ.

FOTOS



F1



F2



F3



F4

Observaciones:
Obra por iniciar



F5


Arg. Miguel Angel Cano Asseleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Dra. Elisa Calderón Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional


Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
